



建设工程施工工艺标准（集成墙板饰面安装施工工艺）-032


序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	放线	激光水平仪	1、根据施工图及现场情况进行尺寸、位置放样，用墨斗弹线后进行墙板及造型位置的安装。 2、先板后线装：先安装主要的板材，再安装线条，先大面积安装，再处理转角、收边等细节。如果遇到立柱，可采用背面开槽的方法将立柱包住。 3、自下而上装：使用墙顶板安装墙面时，需要先从墙底开始安装，逐渐往上增加，直到安装完整个墙面。		定位尺寸误差不大于5mm	激光水平仪，钢卷尺
2	卡扣安装	激光水平仪，气泵、枪钉	一般墙面安装使用墙板专用金属卡扣进行固定连接，卡扣位置与墙板两端头的距离控制在 100mm 以内，卡扣间距一般在 500mm 以内。	墙板安装节点图 	卡扣间距偏差±10mm以内	钢卷尺、红外线测量
3	墙板安装	集成墙板、切割机、气泵、气枪、枪钉、激光水平仪	墙板安装原则上从室内一边有序进行安装，如遇插座、灯具口等位置，在墙板上直接开孔，切忌从两头同时安装，以免最终墙板无法接口。 （1）、普通砖墙固定方式：有水泥抹灰层墙板安装可采用金属卡片，用气排钉或膨胀螺栓进行固定墙面安装。如无水泥石灰层，墙板安装前，龙骨找平后再安装墙板。 （2）、混凝土墙固定方式：采用金属卡片，用水泥直钉枪固定，枪钉无法打入时可采用电锤打孔，里面填充木块或膨胀螺栓，然后采用自攻螺钉固定安装。 （3）、隔断墙面固定方式：隔断墙面采用龙骨支撑的，墙板采用金属卡片固定，金属卡片需与龙骨有效连接，用气排钉或自攻螺钉进行固定安装，不得固定在无连接强度的填充材料上。		垂直度偏差不得大于3mm，平整度不得大于3mm 看墙板外观 1 墙板的花纹颜色是否一致，颜色搭配合理。 2、 安装后是否有刮花，表面是否干净平整。 3、 墙板对接完整无毛刺，内部保温层无外漏现象。 4、查看板材拼接 5、安装后检查板材是否松动平整，平板材料接缝整齐。 6、墙面的线条的拼接处是否割手，收口处完整不影响美观。 7、墙板的排列是否平整，折弯处成直角，光滑平整美观	激光水平仪测量，靠尺+塞尺

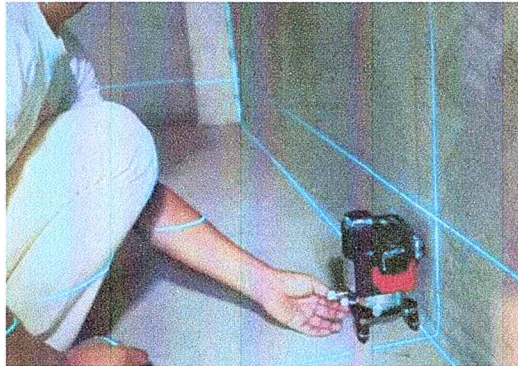


4	墙板与金属装饰线条的安装	金属线条、切割机	需安装工字线侧墙板侧边切割平整，墙板按要求找平找正，工字线非打钉槽口侧插入墙板到底，然后沿墙面压紧，侧面打钉口处使用直钉固定于墙面，工字线固定后插入打钉槽口侧墙板到底，确保接缝处完全插入不漏缝，后一块板按照上述工序重复安装。	 	墙板与槽口接口处不漏缝	用眼观察测量
5	阳角线与墙板的安装	切割机，阳角线条，环保免钉胶	1、按照尺寸要求切割墙板，沿墙阳角处相交两块墙板拼接成 90° 角，转角相邻两块墙板底面采用环保免钉胶粘结或在阳角线安装后不可见处打直钉，墙板固定于墙面，阳角线采用环保免钉胶点胶粘结固定于墙板相交处，点胶 100mm 以内均匀分布，贴压于墙版面，注意加工面不外露，胶无挤出露白。 2、安装时装配式阳角线非打钉侧槽口插入墙板到底，贴紧墙角，打钉口处使用直钉固定于墙面，然后插入打钉槽口侧墙板，确保接缝处完全插入不漏缝。	 	观察阳角无无胶水挤出露白	用眼观察

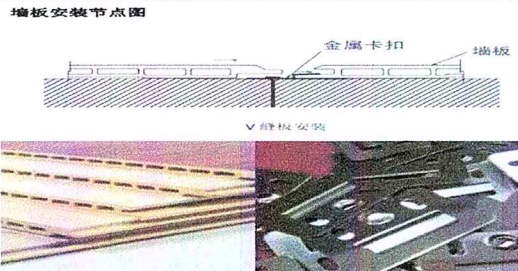

6	阴角线与墙板的安装	切割机, 阴角线条, 环保免钉胶	1、安装时装配式阴角线非打钉侧槽口插入墙板到底, 然后贴紧墙角打钉固定于墙面阴角处, 然后打钉侧槽口插入切好的墙板, 确保接缝处完全插入不漏缝。		观察阴角有无漏缝	用眼观察
7	窗套安装	激光水平仪、切割机、三角尺、胶枪	1、测量洞口垂直度, 根据测量尺寸制作窗架, 窗套板交接处需切割处理, 以便后续安装七字线, 窗套板两两交接处均需要处理, 将窗架放入窗洞, 在窗套底部间隙塞入调整木垫块。 2、在窗套顶的缝中塞入调整木垫块, 方便枪钉固定。调试上门套板水平度, 从上部窗套左右分别拉尺到激光水平线, 两边尺寸一样, 则说明上窗套板水平, 否则则需调整至两边尺寸一样, 塞紧垫块固定。 3、调试左右窗套板垂直度, 观察窗套板是否前倾或后仰并做必要调整, 窗套板固定后四周间隙填充塞入垫块固定四周, 然后所有空隙处打发泡胶填充固定。 4、安装七字线时采用45度拼接, 使用相同规格的七字线。根据窗洞口已固定的窗套板测量七字线安装尺寸后进行裁切和端头加工。注意相邻两根线条的高低差控制在0.5mm以内。对缝处可采用线条环保专用胶水粘结。七字线与墙面板之间可用相近颜色硅酮耐候胶进行弧角打胶固定。		1、七字线时采用45度拼接2、线条的高低差控制在0.5mm以内	三角尺



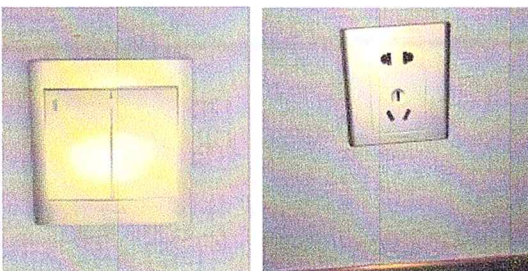8	开关插座	激光水平仪、切割机、三角尺、卷尺、胶枪	1、开关插座面板的安装。当我们把集成墙板安装以后，就可以安装开关插座的面板了。开关插座的做法一般是直接安装在集成墙板的表面利用预留的底盒进行安装。这个时候整个集成墙面已全部安装完成 2、注意问题：集成墙板安装前，墙面上的电路必须安装完成，插座开关的底盒必须准确的定位。这样为集成墙板安装提供便利。 3、在安装集成墙板时，要根据墙面上开关和插座的底盒准确的在集成墙板的位置做出标记。这样才能准确地开出开关插座的孔。千万不要直接安装，导致开关插座的底盒都被封闭。		开关插位置是否水平、平整	激光水平仪
9	踢脚线与墙板的安装	气泵、气枪、枪钉、细木工板、不锈钢踢脚线，切割机，结构胶	踢脚线背部应用木工板衬垫用枪钉固定牢靠，在将不锈钢踢脚线用结构胶固定于木工板上，踢脚线应与木工板粘接牢靠，接合平顺。待粘接强度达到要求后上下接口处用结构胶封闭，收口打胶处应平顺。		平直度不应大于3mm	用靠尺+塞尺
10	材料整理、场地清理	扫帚、畚斗	施工现场剩余材料清理入库放置，零散料头无法二次利用的，清理干净集中装袋堆放至指定地点。		检查墙面无污染、地面无垃圾堆放。	检查、巡视
